



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAYC-004

ACTA No. N15

HOJA 1 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N15-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)

LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA

MUNICIPIO DE: LAS MARGARITAS, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N15-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2641048: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.), EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA; MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL C. ING. RAFAEL RUÍZ MORALES, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0001/2025, CEC/COPCEC/0002/2025, CEC/COPCEC/0003/2025 Y CEC/COPCEC/0004/2025, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. NOÉ ALEJANDRO GORDILLO HERNÁNDEZ,

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?a=avisodeprivacidad>

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LICITACIÓN No: EO-907077974-N15-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)

LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA

MUNICIPIO DE: LAS MARGARITAS, CHIAPAS

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. PLAZO 81 DÍAS.	\$18,466,439.00	\$2,954,630.24	\$21,421,069.24
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. PLAZO 81 DÍAS.	\$18,021,941.41	\$2,883,510.63	\$20,905,452.04
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. PLAZO 81 DÍAS.	\$24,878,494.21	\$3,980,559.07	\$28,859,053.28
CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. PLAZO 81 DÍAS.	\$18,761,638.99	\$3,001,862.24	\$21,763,501.23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N15

HOJA 3 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N15-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. PLAZO 81 DÍAS.

MUNICIPIO DE: LAS MARGARITAS, CHIAPAS

EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. PLAZO 81 DÍAS.	\$17,154,869.34	\$2,744,779.09	\$19,899,648.43
GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. PLAZO 81 DÍAS.	\$14,634,140.57	\$2,341,462.49	\$16,975,603.06
MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. PLAZO 81 DÍAS.	\$18,022,422.36	\$2,883,587.58	\$20,906,009.94
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. PLAZO 81 DÍAS.	\$17,428,563.54	\$2,788,570.17	\$20,217,133.71
FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNANDEZ	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. PLAZO 81 DÍAS.	DESECHADA		
CIA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestra Aviso de Privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?a=avisodeprivacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N15-2026, DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N15

HOJA 4 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N15-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)

LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA

MUNICIPIO DE: LAS MARGARITAS, CHIAPAS

MANUEL OCTAVIO GUILLÉN SUAREZ	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
----------------------------------	---	----------------

OBSERVACIONES


LA PROPUESTA DE FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNÁNDEZ ES DESECHADA POR NO PRESENTAR EL DOCUMENTO No. 28.4 UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, COMO SE SOLICITA EN EL PUNTO No. 11.1 NUMERAL 11.1.a DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 12:20 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS


ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC


C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.


ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES


ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

LICITACIÓN No: EO-907077974-N15-2026


FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)

LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA

MUNICIPIO DE: LAS MARGARITAS, CHIAPAS

INVITADO



ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS



LIC. YASMIN TAPIA SÁNCHEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS

POR LOS CONCURSANTES

NO SE PRESENTÓ
CIA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE

C.V.


C. LAURA CECILIA ACERO ARMENDARIZ
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A.
DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE
C.V.


C. JOSE LUIS ESPINOSA VAZQUEZ
CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS
MALU, S.A. DE C.V.

C. FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNANDEZ
FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNANDEZ


NO SE PRESENTÓ
MANUEL OCTAVIO GUILLEN SUAREZ

C. MARIBEL ALVAREZ MORALES
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.


C. ARNULFO VILLACIS DICHÍ
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.


C. JUAN SERGIO GAMBOA MARTINEZ
EVOLUTIA CONSTRUCCION E
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.


C. NOE ALEJANDRO GORDILLO HERNANDEZ
GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.


C. MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA
MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N15

HOJA 6 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N15-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)

LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA

MUNICIPIO DE: LAS MARGARITAS, CHIAPAS

C. FRANKLIN BERNARDO VELASCO ZENTENO
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES,
S.A. DE C.V.

POR LAS DEPENDENCIAS

ARQ. JORGE ELÍ CANCINO VELASCO
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No. EO-907077974-N15-2026

OBRA: 2641048 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)

LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA

MUNICIPIO: LAS MARGARITAS

FECHA DE APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2029

PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN No. EO-907077974-N15-2026

OBRA: 2641048 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)

LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA

MUNICIPIO: LAS MARGARITAS


FECHA DE APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]

[illegible]



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-907077974-N15-2026

OBRA:

2641048 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

IGNACIO ZARAGOZA
LAS MARGARITAS

FECHA DE APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N15

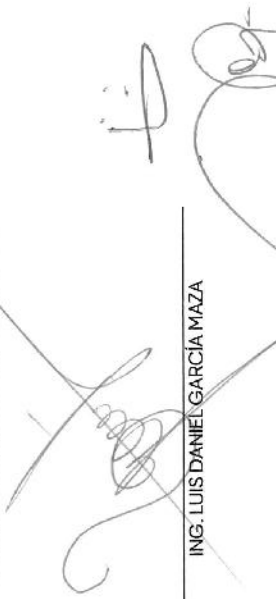
SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA											
28	ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS										
	28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS										
	28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS										
	28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE										
	28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN										
	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS										
	27	27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES									
		27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS									
		27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS									
	26	INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION									
LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO											
CONCEPTOS DE OBRA Y BASICOS											
ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS											
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO											
CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO											
ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA											
20											



C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES



ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

1 CIA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

2 CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.

3 CONSTRUCTORA LAJUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. /
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.

4 CONSTRUCTORA SHIOCHAC, S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-907077974-N15-2026

OBRA:

2641048 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A)

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

IGNACIO ZARAGOZA
LAS MARGARITAS

FECHA DE APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N15

FT-DCE-DLCAYC-006

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA										SI	NO
5	CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MAKU, S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNANDEZ	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EMPRESAS PARTICIPANTES:											
ESCRIPTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA											
CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO											
CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO											
ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS											
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO											
LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN											
LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION											
27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS											
27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS											
27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES											
28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS											
28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE											
28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS											
28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS											
SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA											

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA

[illegible]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N15-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)

LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA

MUNICIPIO DE: LAS MARGARITAS, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC	GILBERTO JOPEL JIMENEZ	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	D ^{to} Manuel Sánchez Sorvin	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	LIC. YASMIN TAPIA SAUCATO	
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	DR. JORGE ELÍ CANCHIO VELAZQUEZ	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N15-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)

LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA

MUNICIPIO DE: LAS MARGARITAS, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
CIA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	ING. Manuel Alvarez M. TEL.	
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	LAURA CECILIA ALEJO ARRENDARIZ TEL.	
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.	Arnulfo Villacorta D. chi TEL.	
CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V.	Jose Luis Esquivel Chique TEL.	
EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Juan Sergio Gimboza Martinez TEL.	
FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNANDEZ	Fco Javier de la Torre TEL.	
GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Noe Alejandro Gardillo Hernandez TEL.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N15-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)

LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA

MUNICIPIO DE: LAS MARGARITAS, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
MANUEL OCTAVIO GUILLEN SUAREZ	NO SE PRESENTÓ	
	TEL.	
MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA	MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA	
	TEL.	
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	ING. FRANKLIN B. VILLASCO ZENTANO	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
